

Welkom

Kockengen Waterproof fase 8 en 9: Welgelegen



Inhoud

- Korte project introductie
- Reeds uitgevoerde werkzaamheden
- Huidige status project
- Planning komende periode



Korte project introductie



gemeente
Stichtse
Wacht


Het project

- Uitvoeringsduur: mei 2022 t/m december 2023
- Het project wordt gecombineerd met werkzaamheden nutspartijen.
 - Stedin vervangt elektrakabel en gasleiding.
 - Gehele wijk wordt van glasvezel voorzien.
- Wat hoeveelheden:
 - Verwijderen oud funderingsmateriaal ca. 18.000 ton
 - Aanbrengen Argex ca. 23.000 m³
 - Aanbrengen bestrating ca. 20.000 m²
 - Aanbrengen riool 3100 m¹
- Werkzaamheden in particuliere tuinen
 - Tuinen leeghalen op kosten van de gemeente
 - Leveren en aanbrengen zand –en grond op kosten van de gemeente
- We werken samen met een klankbordgroep, bewoners uit de wijk
- De bomen die zijn gekapt komen 1-op-1 terug

Het uitvoeringsteam



Fasering werkzaamheden

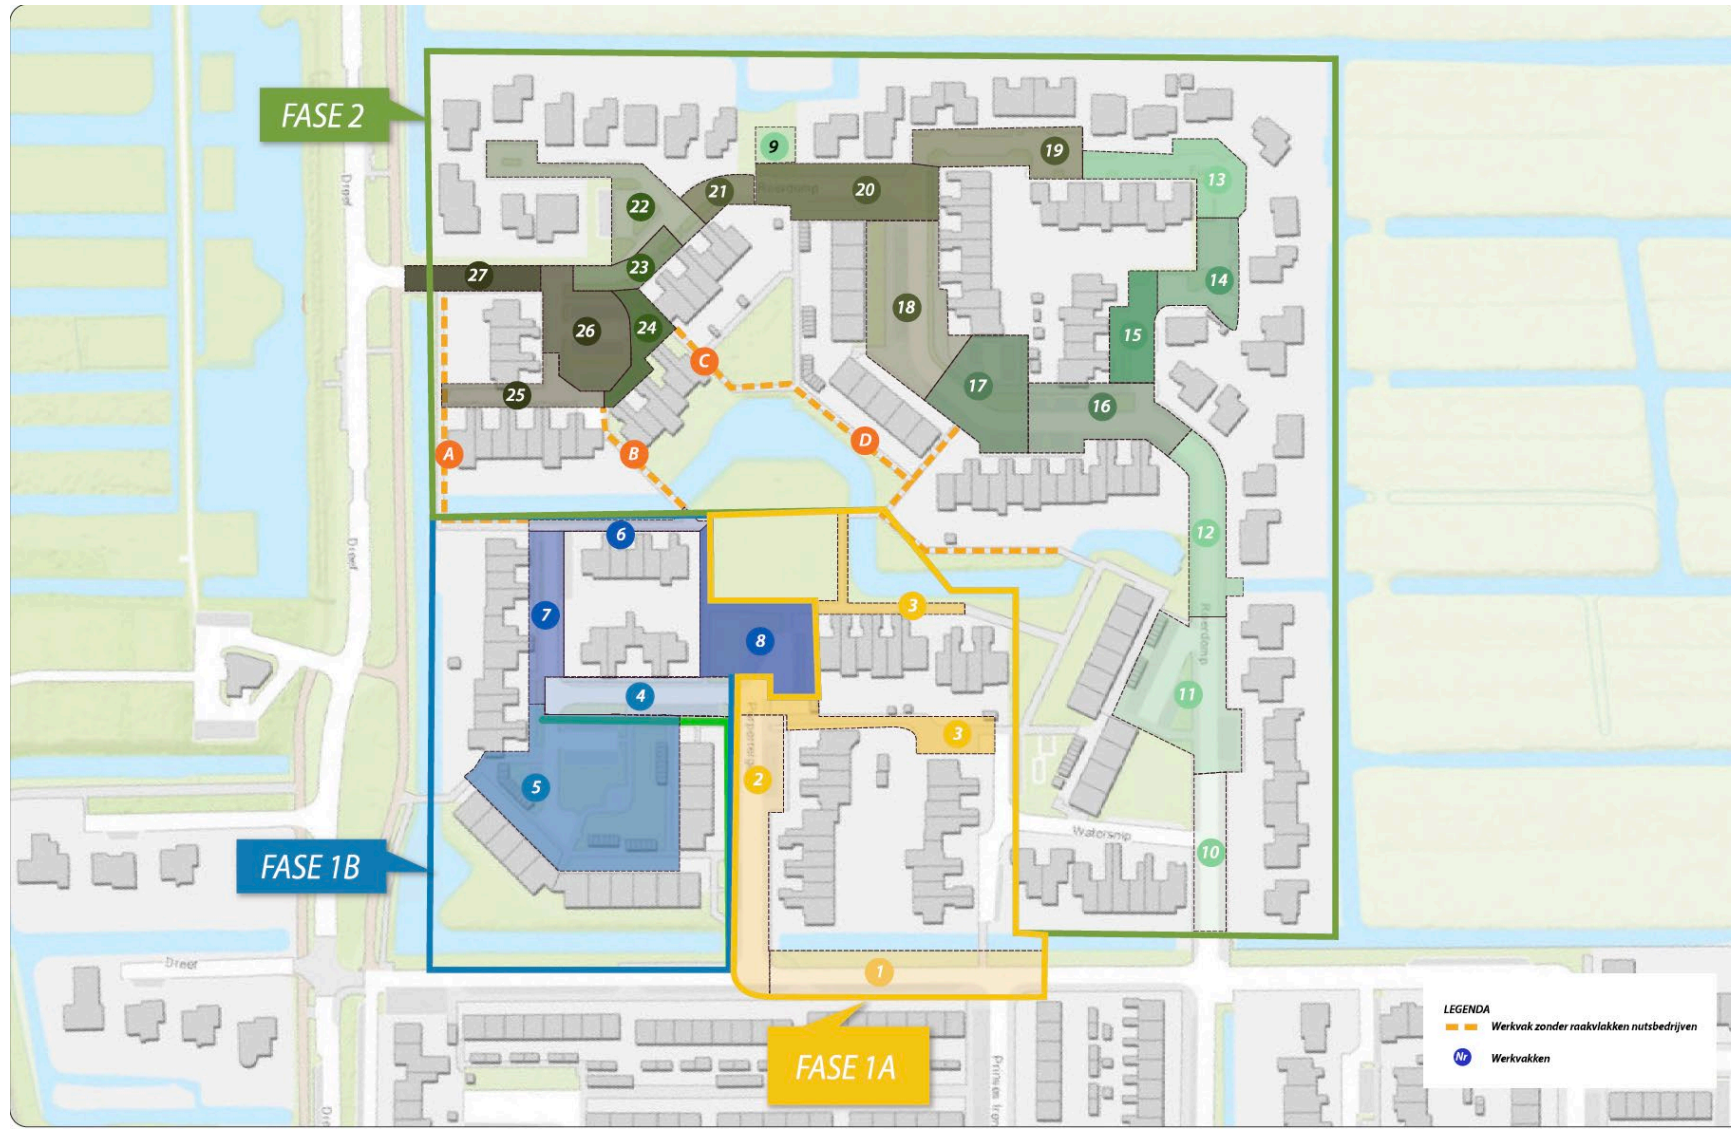

Voor aanvang werkzaamheden



Reeds uitgevoerde werkzaamheden



gemeente
Stichtse
Wacht

Prinses Beatrixweg – vergroten riool



Scholekster



Purperreiger



Purperreiger



Purperreiger



Huidige status project



gemeente
Stichtse
Wacht

Rioolwerkzaamheden Roerdomp



Speelveld Purperreiger is opgeknapt



Bestrating Purperreiger gereed



EMVI maatregelen



Planning



gemeente
Stichtse
Wacht

Planning


Fase 1A Gereed

Fase 1B Rioolwerkzaamheden
Oktober '22 t/m januari '23

Fase 1B Straatwerkzaamheden
November 2022 t/m april 2023

Fase 2 Rioolwerkzaamheden
Start februari 2023 gereed oktober 2023

Fase 2 Straatwerkzaamheden
Half april 2023 t/m eind december 2023

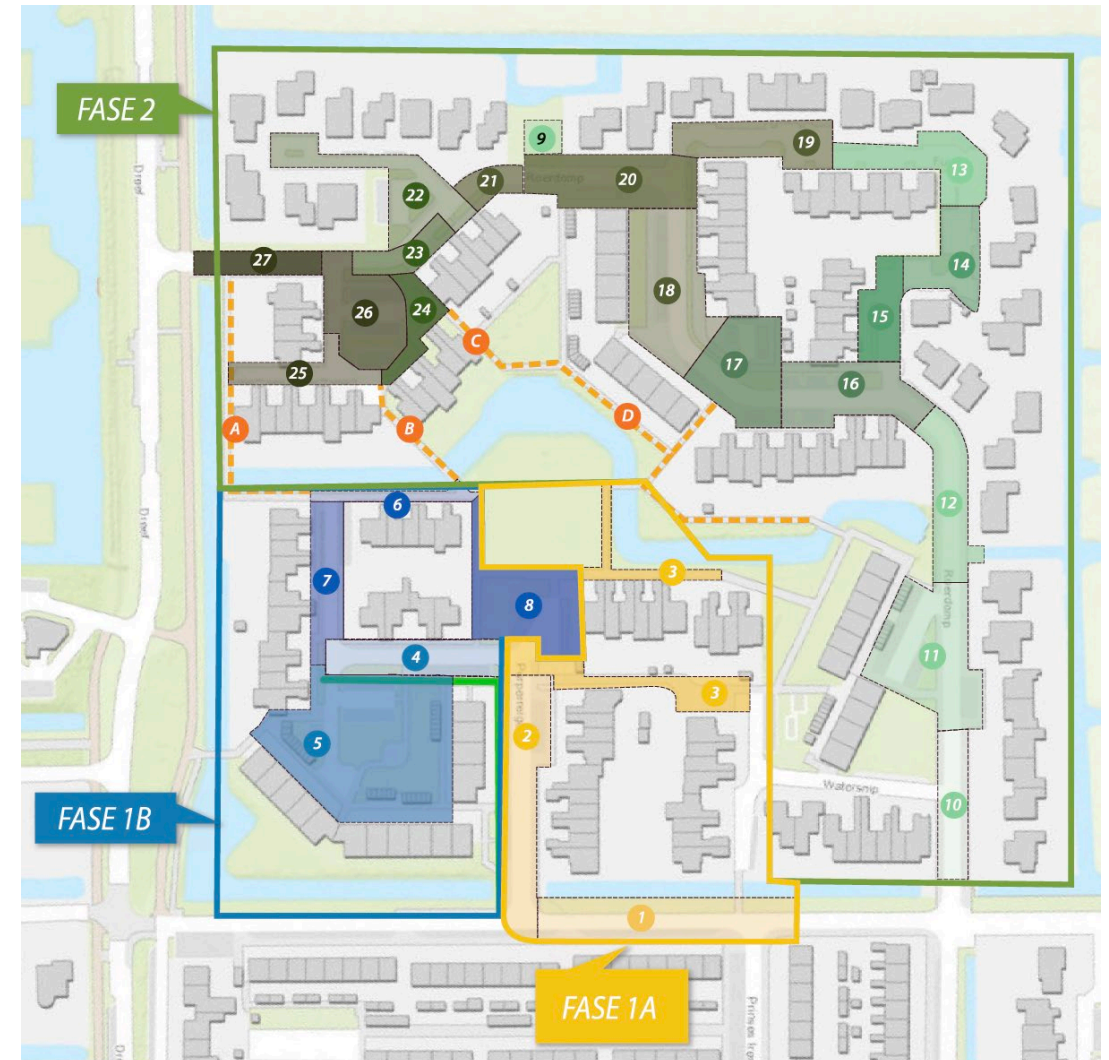

De volgende fasen worden nu voorbereid en voor de kostenraming worden de eenheidsprijzen van aannemer gebruikt om een goede raming te maken. Start werkzaamheden van de volgende fasen is eind 2023 begin 2024.



gemeente
Stichtse
Wacht

Nog vragen



gemeente
Stichtse
Wacht
